

## Intervention graffitis Boissy st léger et Villecresnes



# Intervention sur le Mur du château de Grosbois



Mardi 06 Décembre 2022    Matinée

1. ( **sablage**    **50 M<sub>2</sub>** )

## Intervention SUR le Mur du château de Grosbois



Mardi 06 Décembre 2022

Matinée

( sablage 20 M<sup>2</sup> )

## Intervention sur le Mur du château de Grosbois



Mercredi 07 Décembre 2022

## Intervention sur le Mur du château de Grosbois



Mercredi 07 Décembre 2022

journée

( **sablage** 50 M<sup>2</sup> )

## Intervention sur le Mur du château de Grosbois



Jeudi 8 décembre 2022 Matinée

( sablage 25 M<sup>2</sup> )

## Intervention sur le Mur du château de Grosbois



Jeudi 8 décembre 2022 Matinée

( sablage 30 M<sup>2</sup> )

## Intervention sur le Mur du château de Grosbois



Jeudi 8 décembre 2022    Matinée

**SABLAGE 30 M<sup>2</sup>**

## Intervention sur le Mur du château de Grosbois

Avant



Vendredi 9 décembre 2022

## Intervention sur le Mur du château de Grosbois

Après



Vendredi 9 décembre 2022 journée

sablage 30 M<sup>2</sup>)

travail du Mardi au  
vendredi avec 2 agents du  
06/12/2022 au 9/12/2022  
4 jours

Total 235 M<sub>2</sub>


Sacs Archifine TOTAL 70  
pour une semaine

## Intervention sur le Mur du château de Grosbois



Mardi 20 Décembre 2022

Matinée

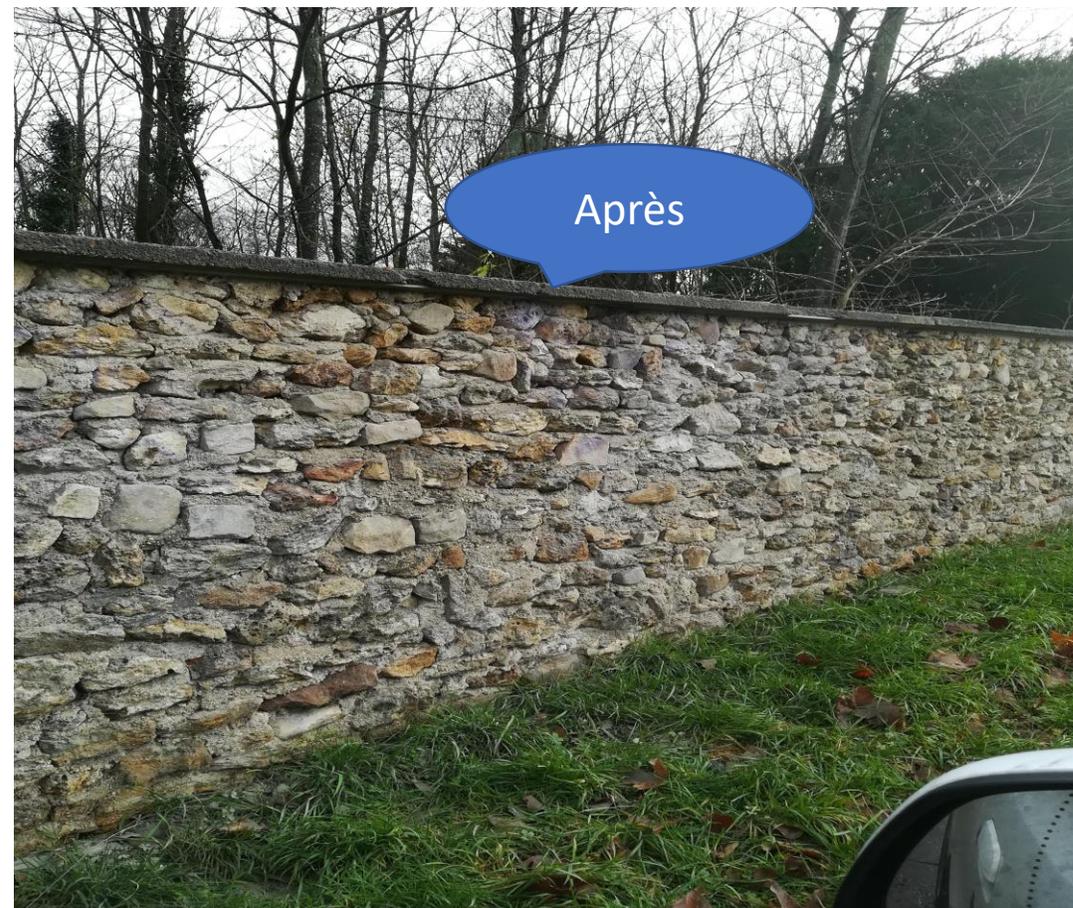

sablage 10 M<sup>2</sup>)

## Intervention sur le Mur du château de Grosbois



Mercredi 21 Décembre 2022 Matinée

sablage

5 M<sup>2</sup>



**Nombre de jours travaillés Sur le grand Mur : 6 jours**

**Quantité d ArchIfine 70 sacs**

**Surface traitée 250 M<sub>2</sub>**

## Intervention sur le Mur du château de Grosbois



Mardi 27 Décembre journée

sablage

25 M<sup>2</sup>

## Intervention sur le Mur du château de Grosbois



Mercredi 28 Décembre journée



sablage 20 M<sup>2</sup>

## Intervention sur le Mur du château de Grosbois



Jeudi 29 Décembre    journée

sablage

15 M<sup>2</sup>

## Intervention sur le Mur du château de Grosbois



Vendredi 30 Décembre journée

sablage 20 M<sup>2</sup>

## Intervention sur le Mur du château de Grosbois



Mardi 03 janvier et Mercredi 04 JANVIER 2023 Matinée

sablage 15 M<sup>2</sup>

## Intervention sur le Mur du château de Grosbois



jeudi 05 janvier et le vendredi 06 janvier ( Matinée )

sablage 25 M<sup>2</sup>

## Intervention sur le Mur du château de Grosbois



Mardi 10 janvier 2023

( Matinée )

sablage 15 M<sup>2</sup>

## Intervention sur le Mur du château de Grosbois



Mercredi 11 janvier 2023

( Matinée )

sablage 25 M<sup>2</sup>

## Intervention sur le Mur du château de Grosbois



Jeudi 12 janvier 2023

( Matinée )

sablage 10 M<sup>2</sup>

## Intervention sur le Mur du château de Grosbois



Vendredi 13 janvier 2023



( Matinée )

sablage 10 M<sup>2</sup>

**Nombre de jours travaillés 12**

**Quantité d Archlfine en sacs 132**

**Surface traitée total 420 M<sub>2</sub>**

**Fin du chantier**
